

제 안 요 청 서

지 원 기 업 명	주식회사 스포이즘
과 업 명	스포츠이즘 기업성장을 위한 erp시스템 개발

2022. 06.

(주)유니비즈컨설팅

〈 목 차 〉

I . 과업개요	1
II . 추진배경	1
III . 사업개요	1
IV . 과업내용(세부 추진 계획)	1
V . 과업수행지침	7
VI . 계약위반에 대한 조치	8
VII . 사업보고	8
VIII . 성과품 제출	9
IX . 보안 준수사항	9
X . 입찰 및 사업자 선정	10
XI . 제안서 작성 및 제출	12
XII . 제안서 평가	14
XIII . 기타사항	17

붙임 : 관련 서식

I. 과업개요

1. 과업명 : 스포이즘 기업성장을 위한 erp시스템 개발
2. 과업기간 : 착수일로부터 2022년 11월 06일 이내
3. 사업예산 : 100,000,000원 (부가가치세 별도)

II. 추진배경

1. 중소스포츠기업의 역량을 강화하여 경쟁력을 강화시키고자 국민체육진흥공단에서는 중소스포츠기업 성장 지원사업을 추진하고자 함
2. 이에 본 사업에 선정된 지원기업의 개별 과업을 원활히 추진하기 위하여 전문성 있는 외부 수행기관을 통해 과업의 완성도 및 품질을 제고하고자 함

III. 사업개요

1. 국내 유망 중소스포츠기업에 맞춤형 지원으로 경영환경 개선 및 글로벌 경쟁력 강화
2. 종합적인 지원으로 다른 업종에 비해 영세한 스포츠 중소기업의 성장 잠재력을 강화시킬 수 있는 기회 제공
3. ‘주식회사 스포이즘’의 ‘스포츠이즘 기업성장을 위한 erp시스템 개발’을 위해 전문적 역량을 갖춘 수행사를 선정하여 기업의 성장동력 확보 및 경쟁력을 제고

IV. 과업 내용(세부 추진 계획)

1. 과업 목적(목표)

○ 효율적,체계적 직원/회원 관리를 위한 어플리케이션 개발

- 2021년도에 진행된 1차 중소스포츠기업 성장 지원사업 컨설팅 결과를 2차 지원사업에서는 실현하기 위해 조직의 체계적 관리 목적인 관리프로그램 어플리케이션 개발을 추진하고자 함.
- 현재 (주)스포츠이즘은 커뮤니티시설 위탁·운영 전문 기업으로써 전국 각지 주거시설 내 커뮤니티 시설 관리 인력이 존재함.
당사의 조직 구조는 각 지사 개념으로 퍼져있는 형태이기 때문에 행

정 및 트레이너들 역시 해당 지역 또는 본사 파견 형태로 직원이 투입되고 있는 상황임.

따라서 각 현장의 인력관리, 근태관리 등 운영 전반에 대한 관리 프로세스 마련이 필요하며, 각 현장에서는 커뮤니티시설 이용자를 관리하기 위한 시스템을 구축하여 차별화된 서비스를 제공하여 운영

- 각 현장별 통일된 회원관리 및 응대 시스템을 구축하여 기업 성장의 발판이 될 수 있는 계기를 만들하고자 하며 회원관리, 예약관리, 결제 등이 가능한 어플(업계에서 회원관리 프로그램을 ‘ERP 시스템’이라고 칭함)을 통하여 편리하고 간편하면서도 체계적인 스포이즘만의 차별화 전략으로 활용하고자 함.

○ 이용자 사용 교육/매뉴얼 콘텐츠를 어플리케이션에 탑재하고 대면교육을 진행하고자 함

- 개발, 테스트 과정을 거친 후 빠른 도입을 위하여 각 현장의 팀장(지점장)급 직원들을 대상으로 사용법 교육을 실시하고 각 현장의 회원들에게 사용법을 안내할 수 있도록 하고자 함.
- 직관적이고 가독성이 좋은 형태로 제작된 교육 매뉴얼을 어플 내에 게시판, 안내페이지 등에 탑재하고 추가적으로 개발 담당자의 2회 이상 대면교육을 통해 실사용자 교육을 진행하고자 함.

- 기존 관리시스템(erp) 사용 시 문제점

- 시스템 불안요소 발생 시 민원 발생되어 위탁 업장 계약해지 등 불이익 발생
- 기존 erp 회사의 시스템 사용 시 매출 공개 및 영업 노하우 노출 인한 경쟁사 출연
- 기존 erp 회사의 도산 시 그 피해는 고스란히 스포이즘의 신뢰성 타격
- 국내 최대의 98개 업장을 보유한 스포이즘이 자체 erp가 아닌 기존회사들의 erp 사용 시 차별화되지 않아 경쟁력 저하

- 자체 관리시스템(erp) 개발 시 장점

- 스포이즘이란 회사는 각종 사업공모(스포츠위탁사업)에서 현장발표(pt)

에서 체계화된 인력구성을 통한 업무 효율성 증대 및 전문성 있는 운영진, 최첨단 회원관리 시스템(erp)을 적용할 수 있다는 강점으로 현장 발표(pt)를 하는데 기존 관리 시스템(erp)을 사용 시 타 업체와의 경쟁에서 우위를 점할 수 없음.

- 스포이즘은 주로 아파트커뮤니티 시설을 운영하는데 기존 관리시스템(erp)으로는 할 수 없고, 한정적임
- 기존 관리시스템(erp)을 커스터마이징하는 비용과 자체 개발 erp와 별반 차이 없음, 그렇다면 효율화, 비용감축 및 자체 수익창출 모형을 얼마든지 변경할 수 있는 자체관리시스템(erp)가 절실함
- 기업자체적 역량 강화와 앞으로 다양한 사업분야로의 진출을 기대하고 있으므로 자체적 관리프로그램 개발을 통해 기업 규모 확대의 발판을 마련하고자 함.

2. 세부 과업 내용


과업 1 : 당사의 경영시스템 및 관리시스템 분석

- 기업 구조 분석 : 기업 운영 구조 전반(지점현황, 지역분포, 근무자 구조 및 조직도 등)에 관한 분석 및 이해를 기반으로 하여 과제 추진
- 관리시스템 분석 : 인적/물적자원 관리 현황, 본사와 지점별 관리 현황, 지점의 현장관리(회원/레슨/예약 등), 기업 관리 효율성 등 분석

과업 2 : 시스템 개발 계획 설계

- 유사 기업체 관리 시스템(직원관리, 현장관리, 이용자관리 등) 현황 분석
- 당사에 적합한 ERP시스템/앱개발 전문 컨설팅
- 탑재 필요한 목표 프로세스/기능 설계
- UI/UX 계획 수립 및 스타일 디자인

<관리 프로그램 목표시스템 개념도>

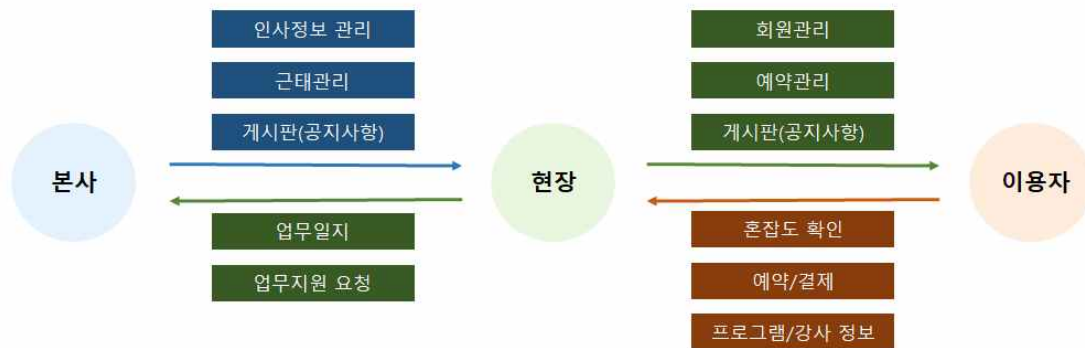

과업 3 : 현장/회원 관리 프로그램 어플 구축

- 아래 표에 제시한 요구사항을 반영하여 프로그래밍
- 앱 개발 -> 테스트 -> 검수 -> 완료 -> 도입 -> 경영개선 기대효과 분석
- 기능/성능
- 시스템, 데이터, 인터페이스, 보안, 사업지원, 제약사항

과업 4 : 이용자 매뉴얼 탑재, 교육

- 개발된 어플리케이션에 대한 이용자 매뉴얼을 제작하여 탑재
- 스포이즘 지점별 팀장급 직원들을 대상으로 어플 사용 교육을 2회 이상 대면 교육 제공

			• 권한관리 기능은 관리자 계정에만 부여 • 사용자별, 프로그램별 권한 설정 기능(입력,수정,삭제,조회,출력)
1	기능	권한관리	• 본사와 현장, 현장과 이용자 간 별도 권한관리 가능 시스템 구축 • 사용자 편의성, 향후 시스템 확장성 및 운영성을 고려하여 구현 • 퇴사처리 이후에는 시스템 접근 통제
2	기능	인사정보 관리	• 현장(지점)별 인사 관리 탭, 코드 생성 • 모든 인사기록정보에 대한 한 화면에서의 조회 기능 • 권한 부여 혹은 승인 시 수정 가능하게 함
3	기능	근태관리	• 현장별>개인별 근태 등록 관리 • 휴무, 연차, 병가 등 기록 및 일수 관리 • 업무일지 작성 관리
4	기능	게시판(공지사항)	• 본사-> 현장 / 현장->이용자 게시판 별도 생성 • 본사->현장: 게시판 내 직원관리 탭을 추가하여 운영 교육 매뉴얼, 자료 탑재하도록 함 • 현장->이용자: 각 시설에 대한 공지사항 글, 이미지 모두 작성 가능하게 함
5	기능	회원관리	• 각 현장별 회원 인적사항, 프로그램 수강 내역, 예약 및 결제 내역, PT잔여세션 등을 기록 • 현장 관리자 계정은 해당 현장의 회원정보만 확인할 수 있도록 함.(타현장 정보 조회 불가능하게 할 수 있는 권한 필요)
6	기능	예약 및 결제	• 현장 무/유료 프로그램 정보 게시 후 프로그램별 예약, 모바일 결제 기능 • 결제 내역 처리방법 추후 논의
7	기능	강사,프로그램 게시	• 각 현장의 종목별 강사,프로그램 정보 게시 기능 • 종목별/시간대별/연령대별 프로그램 리스트 게시 기능
8	기능	혼잡도 관리	• 현장의 시설별(헬스장, 수영장, 골프장, 독서실 등) 이용 현황과 혼잡도를 5개 항목으로 나누어 게시 • 실시간 혹은 최대 30분 이내 이용현황을 반영하도록 함
10	성능	시스템 가용성 및 안정성	• CPU 평균 사용률은 어느 조건 하에서도 90% 이하 유지 • 메모리 평균 사용률은 어느 조건 하에서도 85% 이하 유지 • 이용자 수 증가에 따른 운용 안정성을 확보할 수 있도록 시스템을 구성하여야 함 • 빈도 높은 기능, 중요 기능에 따라 운영 환경하에서 성능 시험을 실시하고 확인하여야 함 • 과부하에 따른 안정성 사전 점검
11	성능	시스템 성능	• 성능진단 도구를 활용한 정확한 성능을 진단 • 처리속도가 느린 작업의 경우, 사용자에게 사전 알림 필요

1	시스템	시스템 도입	- 최종 도입 전에 시스템 전반에 대한 사전 이용 테스트 후 총괄담당자 승인 필요 - 시스템 납품 및 설치는 기업 승인 후에 진행되도록 하며 설치 단계별 작업계획서를 제출
2	시스템	설치 및 운영	- 소프트웨어 개발보안 준수 - 시스템 모델 전반에 대하여 개발자, 발주기관, 전문가 등이 검증하여야 함 - 제조사 공급 및 기술지원 약속서 제출
3	데이터	데이터 관리 방안	- 방대한 양의 데이터 표준관리를 위한 관리방안과 데이터 변경이력을 효과적으로 관리할 수 있는 방안을 제시하고 적용하여야 함 - 오류 데이터 진단방안 및 개선 절차를 제시하여야 함
4	인터페이스	온라인 도움말	- 화면에서의 해당 화면 내 기능 사용 순서를 안내해야 함 - 오류 처리사항과 해결 방법이 있어야 함
5	인터페이스	상호작용 메시지	사용자와 시스템 간의 상호작용 활동에 대한 확인 메시지를 제공
6	인터페이스	UI/UX	- 전체 시스템에서 통일성 있는 UI 구성 - UX는 이용자의 편의성을 우선으로 직관적이고 간략한 설계 필요 - 페이지 위치 정보를 MAP형태로 표시 - 사용자의 권한에 따라 수정/삭제/조회 등의 버튼 기능 제어 - 게시판 등에 문자 입력 시, 필드의 속성에 따라 적절한 언어로 우선 적용되도록 하며 입력창의 크기가 적절하지 않아 문자가 보이지 않거나 불필요한 공백이 남지 않도록 최적의 크기로 설계 및 구현 - 이용자의 예약 관리가 용이하도록 달력, 스케줄표 등의 형태로 표시
7	인터페이스	사용자 인터페이스 보안	- 인사 정보, 회원 정보 등 개인정보가 별도의 절차 없이 노출되지 않아야 함 - 정보에 대한 접근은 사용자 권한에 의해 통제되어야 하고, 그룹별, 개인별, 기능별로 구체적으로 통제되어야 함 - 결제 시스템을 구축 해야함으로 금융, 보안 기관 시스템에 연계 가능여부 확인
8	보안	보안 요건	- 수행사는 사업수행에 사용되는 인원, 문서, 장비 등의 보안관리계획을 수립하여야 하며, 보안상 결격사항이 없도록 조치 「개인정보 보호법」 제26조(업무위탁에 따른 개인정보의 처리 제한)을 준수하여 개인정보관리를 철저히 이행
9	사업 지원	하자보수	- 구매하여 공급한 제품과 자체 개발한 s/w를 포함한 전 시스템의 무상보증기간은 사업을 종료한 날부터 12개월로 함 - O/S, 각종 Utility 및 상용 SW의 신규 버전 출시 시 무상 또는 유상 업그레이드 여부를 제시
10	제약사항	규정의 준수	- 모든 산출물은 지식재산권과 관련된 사항을 주의/준수하며, 문제 발생 시 수행사가 모든 책임을 짐 - 사업 중 생성 및 구현된 모든 저작물은 저작권 문제가 발생하지 않도록 구현

3. 산출물

연번	산출물명	단위	목표 수량	비고 (세부 규격)
1	ERP시스템 앱 개발	개	1	- 본사에서 현장관리 / 현장에서 회원관리 가능 시스템의 어플리케이션 1개 (혁신적, 효율적 경영시스템의 도입과 적극적 홍보를 통한 신규계약, 재계약 업장 수 증가 예상)
2	기업 분석 자료	부	3	- 기업 경영/관리 현황 분석 1부(20p 이상) - 어플 도입 후 기대효과 분석 1부(30p 이상) - 유사기업 직원 매뉴얼 형태, 현황 등 분석 1부(30p 이상)
3	개발 작업계획서	부	1	- 개발 작업 전반에 걸친 진행단계를 기재한 작업 계획서
4	개발 진행 보고서	부	5	- 어플리케이션 개발 및 도입 단계에 따른 보고서 (단계: 개발 -> 테스트 -> 검수 -> 도입 -> 경영개선 기대효과 분석 / 단계별 한 부씩) *경영개선 기대효과: 향후 3년간 어플리케이션 도입 후 기대되는 매출액 증가율, 경쟁력 강화로 인한 신규 계약 업장 수 증가율 예측치 작성
5	어플 사용 교육 자료	편	1	-어플 사용에 대한 사용자 매뉴얼 자료로 향후 새로운 계약 현장이 늘어남에 따라 지속적 사용 교육 예정 (게시판에 탑재)

V. 과업수행지침

1. 과업수행자는 본 사업의 목적과 취지 등을 충분히 숙지하고, 발주기관의 의도와 방향으로 과업을 수행하여야 합니다.
2. 과업 진행 절차 단계마다 서류 및 성과물에 대한 발주기관의 승인을 얻은 후 다음 단계 작업을 진행합니다.
3. 과업수행자는 과업의 목적 및 방향을 충분히 이해하여 과정별로 발주기관과 협의하여 진행하되, 상호 의견이 다를 경우 발주기관과 과업수행자가 협의하여 결정하며, 협의 내용에 대한 변동사항에 대하여는 발주기관의 사전 승인을 받아야 합니다.
4. 본 과업수행 기간 중 여건변동, 수정사항이 발생한 경우 세부 과업의

추진 내용 및 추진일정을 발주기관과 과업수행자가 협의하여 변경할 수 있습니다.

5. 본 과업 과정에서 발생하는 물적·인적 사고에 따른 제반 비용과 후속 처리는 책임 당사자가 부담하며, 저작권·초상권 등의 침해에 따른 법적 분쟁의 책임은 과업수행자에게 있습니다. 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기한 경우에는 발주기관과 과업상대자가 협의하여 처리합니다.
6. 과업수행자는 납품일정을 필히 준수해야 하며 납기일정을 어길 시에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제74조에 의한 지연 배상금을 납부해야 합니다.
7. 본 과업내용은 최소사항만을 규정하였으므로 과업내용이 누락이 되거나 불분명한 사항은 발주기관 및 지원기업과 협의하여 결정하며, 사전에 협의되지 않은 사항은 인정되지 않습니다.

Ⅵ. 계약위반에 대한 조치

다음의 사항이 발생할 경우 계약위반으로 간주하여 계약해지 등 법적 조치를 취할 수 있고 이에 대해 과업수행자는 이의를 제기할 수 없습니다.

1. 제반 계약사항을 기한 내 이행하지 않았을 경우
2. 과업수행 중 불성실 또는 부주의로 인한 중대한 과실이 인정될 경우
3. 실제 운영인력 등이 계약 시 제출한 계획과 크게 상이한 경우
4. 제출된 각종 증빙자료가 허위로 작성되었음이 인정될 경우
5. 기타 법령 또는 2022년도 중소스포츠기업 성장 지원사업 운영기준이 정하는 사항이 발생한 경우

Ⅶ. 사업보고

1. 착수보고 : 계약일로부터 7일 이내 과업착수보고서 1부 제출 및 승인
(착수보고회를 수행계획서 제출로 대체 가능)
2. 중간보고 : 과업 진행절차 중간단계 과업수행 결과(산출물 포함)를 제

출보고 및 승인

3. 수시보고 : 발주기관 요청 시 또는 현안사항 검토 시
4. 최종보고 : 과업종료 7일 전까지 최종보고서(모든 성과내용 및 자료 일체)의 초안을 발주기관에 제출하여 심의를 받고, 수정사항에 대해서는 보완하여 제출, 승인을 득한 후 최종보고서 제출

VIII. 성과품 제출

1. 본 과업 완료 후에도 성과품의 미비 사항이 발견될 시에는 수급자 부담으로 보완 제출하여야 한다.
2. 성과품의 규격 및 부수는 발주기관의 요구에 따라 조정될 수 있으며, 최종 제출 전 발주기관과 사전 협의를 거쳐 제출하여야 한다.

○ 성과품 수량

구분	내용	규격	수량
과업 결과보고서	1. 최종보고서(컬러 인쇄본)	A4	5부
USB	1. 성과품 수록 USB (보고서 및 관련자료 일체 포함)	USB	1개
산출물 및 성과	1. 산출물(실물 또는 증빙자료) 2. 성과(KPI)달성 증빙자료		각 1종씩

IX. 보안 준수사항

1. 과업수행자는 본 과업에 참여하는 모든 인원은 신원이 확실하여야 하며, 수행인력의 변동사항이 있을 경우에는 신상변동(해외여행 포함) 사항 발생 즉시 발주기관에 통지하여 확인을 받아야 합니다.
2. 과업수행자는 과업 수행 중 취득한 정보, 과업 진행 시 발생한 중간산출물 및 모든 과업 성과품은 발주기관의 사전 승인 없이 타 목적을 위해 사용할 수 없고 임의로 소유하거나 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안 됩니다.
3. 본 과업 완료 후 과업과 관련된 모든 자료는 발주기관에 납품하여야
